

OFICIO: 2224/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 14 de abril de 2016.

Ing. Roberto Dávalos López.
Secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B Piso 2,
Colonia Miraflores C.P. 44270.
Ciudad.

Asunto: Notificación de Observación.

En ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 229, 231, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; conforme a la verificación **No. 078/2015** y respecto a la obra: **"Rehabilitación de las calles Cueva Brambila, 12 de Diciembre, Arturo Arias, Juan Pablo II y Lázaro Cárdenas en el municipio de Tecolotlán, Jalisco"**; donde funge como ejecutora la empresa **Grupo Constructor STRADE, S.A de C.V.**, bajo la orden de trabajo **No. LP-246-13** y asignación **No. SIOP-FOEDEN LP-246-236-01/13**, Supervisada por el **Ing. José Soto Nájera**, le informo:

Después de efectuada la revisión documental a las estimaciones Nos. 1, 2, 3 y 5, realizada la verificación física a la obra, se detectaron diferencias volumétricas en los conceptos Nos. 1, 22, 23, 35, 50, 51, 53, 54, 64 y 68 de la estimación No. 1; los similares 12, 13, 85, 86 y 90 de la estimación No. 2; el concepto 32 de la estimación No. 3 y los conceptos 28 y 34 de la estimación No. 5, debido a que las medidas y/o cantidades reales obtenidas en obra por parte del Auditor comisionado para realizar la verificación no coinciden con las utilizadas para calcular los volúmenes cobrados en las estimaciones citadas.

La ubicación de los elementos observados corresponde a los planos y croquis anexos a las estimaciones que correspondan, las cuales fueron proporcionadas por la propia Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, las diferencias mencionadas y los importes derivados de multiplicar dichas diferencias por los precios unitarios correspondientes, se detallan en el formato de observación pecuniaria anexo a este documento (5 hojas).

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



Contraloría del Estado

Mano
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Original c/faxo
12 MAY 2016
y tres copias sl anexas
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
14:25 Hrs.

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

20 ABR. 2016

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104



Contraloría del Estado

OFICIO: 2224/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
 Y CONTROL DE OBRA

Por lo anteriormente expuesto, se observa la cantidad de **\$161,156.26** (CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, mediante folio **No. 048/2016** (5 hojas). Por lo que le solicitamos las aclaraciones pertinentes y se notifique a este Órgano de Control y Vigilancia en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de que se reciba el presente, sobre las acciones procedentes.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

M. B. Barboza
Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
 Contralor del Estado.

- c.c. **M.A.C. María Luiza Martínez Almaraz**.- Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional.- Av. prolongación Alcalde 1351 Edificio B, C.P. 44270 Col. Miraflores.- Para conocimiento.
Ing. Joel Ruiz Martínez.- Director General de Obras Públicas del Estado.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores C.P. 44260. Para conocimiento.
Lic. Elisa Julieta Parra García.- Director General Jurídico.- Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, C.P. 44270 Col. Miraflores.- Para conocimiento.
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70 3er. Piso Plaza Tapatía, C.P. 44100.- Para conocimiento.
Lic. Edgar. Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa.- Mismo fin.

Doc
16/05/16
for
 LEBN/EVA/LFLG/dcgz.

GOBIERNO DE JALISCO
 PODER EJECUTIVO
 CONTRALORÍA DEL ESTADO

20 ABR. 2016

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Av. Vallarta 1252
 Col. Americana, C.P. 44160
 Guadalajara, Jalisco, México
 Tels. 01 (33) 3668 1633
 01 (33) 4739 0104

**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACIÓN PECUNIARIA**

ENTE EJECUTOR: SIOP
 MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN: SIOP-FOEDEN-LP-246-238-01/13
 NÚMERO DE FOLIO: 048/2016
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de abril de 2016
 MONTO OBSERVADO: \$ 98,365.15
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No. 1
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 078/2015


CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.
 MUNICIPIO: TECOLOTLAN
 LOCALIDAD: TECOLOTLAN
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CUEVA BRAMBILA, 12 DE DICIEMBRE, ARTURO ARIAS, JUAN PABLO II Y LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN


PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS


OBSERVACIONES EN:
 VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)


No. FACTURA Y/O LISTA DE PAYA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
37	CONCEPTO No. 1 TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INC. MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS. PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE CONCEPTO No. 22 CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO CONCEPTO No. 23 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES EN CAJA A BANCO DE DESPEDIDO CON MEDIOS MECANICOS CONCEPTO No. 35 TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INC. MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS. PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE CONCEPTO No. 50 CORTE DE TERRENO EN MATERIALES TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJÓN PARA ALOJAR PAVIMENTO CONCEPTO No. 51 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES EN CAJA A BANCO DE DESPEDIDO CON MEDIOS MECANICOS CONCEPTO No. 53 FORMACIÓN DE CAPA SUBRASANTE UTILIZANDO MATERIAL TMA 3 A FINOS DE 20 CMS DE ESPESOR CON UN GRADO DE COMPACTACIÓN DE 95% CONCEPTO No. 54 FORMACIÓN DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. POR MEDIO DE MATERIAL DE 1/2 A FINOS CONCEPTO No. 64 TRAZO LINEAL Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON APARATO TOPOGRÁFICO, A CIELO ABIERTO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INC. MADERA DE PINO DE 2DA. PARA CONCEPTO No. 68 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10 DE DIAMETRO SERIE 25. INC. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 ML	2358.69 960.73 960.73 2711.76 758.00 758.00 425.04 425.04 1885.06 178.80	2224.21 845.81 845.81 2052.48 473.69 473.69 291.52 291.52 1885.94 175.10	134.480 114.925 114.925 659.285 284.310 284.310 133.523 133.523 9.119 3.500	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	10.14 34.25 32.06 10.14 34.25 32.06 116.39 253.75 10.14 217.43	1,363.63 3,936.18 3,684.50 6,685.15 9,737.62 9,114.98 15,540.68 33,881.33 92.47 761.01 -

NOTAS:
 SUB-TOTAL ESTA HOJA \$ 84,797.54
 I.V.A \$ 13,567.61
 TOTAL \$ 98,365.15

ELABORÓ: 
 ARQ. ADÁN DWÁR ESQUIARTE MONTES
 AUDITOR

REVISÓ: 
 ARQ. GUILLERMO ARISTA HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR

Vo.Bo. 
 INC. LUIS FELIPE LOZA GARCÍA
 COORDINADOR DE OBRA

AUTORIZÓ: 
 LIC. LIDIA GARZA VALDIVIA AHUMADA
 DIRECTORA DE AREA DE OBRA DIRECTA

**DIRECCION DE AREA DE OBRA DIRECTA
 FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA**


ENTE EJECUTOR: SIOP
 MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: LICITACION PUBLICA
 No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-FOEDEN-LP-246-238-01/13
 ORDEN DE TRABAJO: LP-246-13
 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.
 MUNICIPIO: TECOLOTLAN
 LOCALIDAD: TECOLOTLAN
 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS CALLES CUEVA BRAMBILA, 12 DE DICIEMBRE, ARTURO ARIAS, JUAN PABLO II Y LAZARO Cárdenas EN EL MUNICIPIO DE TECOLOTLAN


NÚMERO DE FOLIO: 048/2016
 FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de abril de 2016
 MONTO OBSERVADO: \$ 23,656.49
 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No. 2
 No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 078/2015


OBSERVACIONES EN:
 VOLÚMENES PAGADOS EN EXCESO
 ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
 OTROS (ESPECIFIQUE)

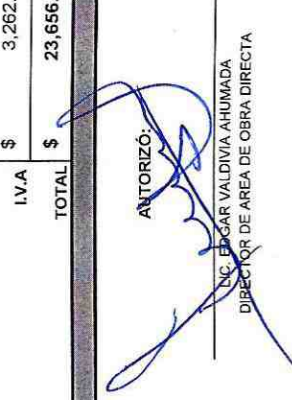
PAGOS IMPROCEDENTES
 CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
 ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN Y/O FACTURADO	VOLUMEN VERIFICADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
	CONCEPTO No. 12 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CORRUGADO DE 24 DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO	ML	234.00	231.50	2.500	\$ 1,229.49	\$ 3,073.73	
	CONCEPTO No. 13 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% DE SU P.V.S.M. INCORPORANDO HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS DE 20 CMS	M3	420.84	418.24	4.603	\$ 143.24	\$ 659.41	
	CONCEPTO No. 85 FORMACIÓN DE EMPEDRAO DE 10 CMS DE ESPESOR ZAMPEADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO ARENA 1. 3 EN PROPORCIÓN MORTERO-PIEDRA 60-40, IN. CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	728.95	670.34	58.610	\$ 167.11	\$ 9,794.32	
	CONCEPTO No. 86 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN ROMANO ROJO DE F'c= 300KG/CM2 DE SECCIÓN 25 CMS DE LARGO 22.5 CMS DE ANCHO Y 8 CMS DE ESPESOR, INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	M2	563.03	547.91	15.120	\$ 275.12	\$ 4,158.79	
39	CONCEPTO No. 90 MACHUELO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE SECCIÓN DE 270 CM2 Y COLADO SOBRE CIMIENTO DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ESPESOR, INC. FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML	716.37	708.63	7.740	\$ 349.65	\$ 2,706.29	
NOTAS:							SUB-TOTAL ESTA HOJA	\$ 20,393.53
							I.V.A.	\$ 3,262.96
							TOTAL	\$ 23,656.49

ELABORÓ: 
 ARQ. ADÁN OMAR EGÜARTE MONTES
 AUDITOR

REVISÓ: 
 ARQ. GUILLERMO ARISTA HERNÁNDEZ
 SUPERVISOR

Vo.Bo. 
 ING. LUIS FELIPE TOZA-GARCÍA
 COORDINADOR DE OBRA

ANTORIZÓ: 
 ING. EDGAR VALDIVIA AHUMADA
 DIRECTOR DE AREA DE OBRA DIRECTA

DIRECCION DE AREA DE OBRA DIRECTA
FORMATO DE OBSERVACION PECUNIARIA

ENTE EJECUTOR:

MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA:

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION:

ORDEN DE TRABAJO:

CONTRATISTA:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

NOMBRE DE LA OBRA:

SIOP

LICITACION PUBLICA

SIOP-FOEDEN-LP-246-238-01/13

LP-246-13

GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.

TECOTLTLAN

TECOTLTLAN

REHABILITACION DE LAS CALLES CUEVA BRAMBILA, 12 DE DICIEMBRE, ARTURO ARIAS,
JUAN PABLO II Y LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE TECOTLTLAN

NÚMERO DE FOLIO: 048/2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 de abril de 2016

MONTO OBSERVADO: \$ 8,716.22

EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACIÓN No: 3

No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN: 078/2015

PAGOS IMPROCEDENTES
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS

OBSERVACIONES EN:

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
OTROS (ESPECIFIQUE)

No. FACTURA Y/O LISTA DE RAYA:

CONCEPTO

UNIDAD

VOLUMEN ESTIMADO Y/O FACTURADO

VOLUMEN VERIFICADO

DIFERENCIA DE VOLUMEN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

CONCEPTO No. 32
MACHUELO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 270 CM2 Y COLADO SOBRE CEMENTO DE PIEDRA BRAZA DE 40 CM5 DE ANCHO X 40 CM DE ESPESOR

ML

655.50

634.01

21.490

\$

7,513.98

43

NOTAS:

SUB-TOTAL ESTA HOJA \$ 7,513.98

I.V.A \$ 1,202.24

TOTAL \$ 8,716.22

ELABORÓ:

ARQ. ADAN OMBREGUARTE MONTES

AUDITOR

REVISÓ:

ARQ. GUILBERMO ARISTA HERNANDEZ

SUPERVISOR

V.o.Bo.

ING. LUIS TELPE LOZA GARCIA

COORDINADOR DE OBRA

AUTOBIZO:

LIC. EDGAR VALDIVIA AHUMADA

DIRECTOR DE AREA DE OBRA DIRECTA

