



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTÍCOLA.  
060501/232/2011

Guadalajara, Jal., 08 de agosto de 2011

114294

**ING. JORGE GASTON GONZALEZ ALCKERRECA**  
**DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA.**  
**PRESENTE:**

Por este medio reciba un cordial saludo, en atención a su oficio 173/DGVCO-DOD-RT/2011, en el cual se envían observaciones sobre la revisión documental y física por personal adscrita a la Dirección General a su cargo; sobre la obra "Construcción y Equipamiento de Centro de Servicio Ganadero", en el municipio de Villa de Purificación sobre concepto de la obra pagada no ejecutados con los siguientes números de conceptos:

Concepto	No.511540	Concepto	No.511564
Concepto	No.511543	Concepto	No.511567
Concepto	No.511555	Concepto	No.511591
Concepto	No.511558	Concepto	No.511594
Concepto	No.511561	Concepto	No.511597

Al respecto le hago llegar en medio digital material fotográfico sobre los conceptos debidamente instalados en el sitio del proyecto; lo anterior para que sean tomados en cuenta y de considerar pertinente realizar visita de campo para su verificación y poder continuar con el proceso y conclusión de las observaciones.

Cabe hacer mención que el proyecto se encuentra trabajando cumpliendo con el objetivo del mismo.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**MC. LUIS ESTEBAN ALVA MUÑOZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y HORTOFRUTICOLA.**

c.c.p. L.A.E. ÁLVARO GARCIA CHÁVEZ.- Secretario de Desarrollo Rural.  
c.c.p. MTRA. MARIA DEL CARMEN MENDOZA FLORES.- Contralor Del Estado.  
c.c.p. Archivo. Control 9558

RPR/lcs

DESPACHO  
RECIBIDO  
10 AGO 2011  
9:15  
Pilas eja

RECIBIDO  
12 AGO 2011  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"

RECEBIDO  
 DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA  
 12 AGO 2011

Recibido  
10 Agosto 11  
Betty



002970

OFICIO: 173/DGVCO-DOD-RT/2011  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 02 de junio de 2011

Ing. Luis Esteban Alva Muñoz.  
Director General de Fomento Agropecuario  
y Hortofrutícola de la Secretaría de Desarrollo Rural.  
Presente.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracción VII; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, habiéndose practicado revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra a mi cargo, a la obra: "Construcción y Equipamiento de Centro de Servicio Ganadero", en el municipio de Villa Purificación, Jalisco; donde funge como contratista la empresa: Construcciones DUARTE, S. de R. L. de C.V. de bajo contrato No. SEDER/DGFAH/DG/AD/006/09, con la orden de trabajo SDR-779/09, supervisada por el Ing. Darío Guzmán Rodríguez, hago de su conocimiento que después de efectuada la verificación documental a las estimaciones 1, 2 y 3 y realizada la verificación física a la obra, se desprende la siguiente:

**Estimación 1**

**Observación Pecuniaria**

**Conceptos de obra pagados no ejecutados**

**Concepto 511540.-** Suministro y colocación de corta circuito 23 kv, fusibles 5 amp., incluye: Mano de obra y todos los materiales para su correcta ejecución. Se observa 1 pieza que importa la cantidad de \$ 1,692.53 (Un mil seiscientos noventa y dos pesos 53/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizada en la obra.

**Concepto 511543.-** Suministro y colocación de apartarrayos de óxido de zinc 23 kv. Se observan 3 piezas que importan la cantidad de \$ 5,759.54 (Cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 54/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizados en la obra.

**Concepto 511555.-** Suministro e instalación de cinchos de acero inoxidable. Se observa 3.30 mts. que importan la cantidad de \$ 394.28 (Trescientos noventa y cuatro pesos 28/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no se localizados en la obra.

**Concepto 511558.-** Suministro e instalación de varillas de 3.00 mts. Cooper Weld con protocolo. Se observan 5 pzas. que importan la cantidad de \$ 2,037.42

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

www.jalisco.gob.mx



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
OFICIO DEL C. SECRETARIO  
RECIBÍO  
FECHA 09 JUNIO 2011  
HORA 11:55 am

Con anexo original y copia





002979

OFICIO: 173/DGVCO-DOD-RT/2011  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

GOBIERNO  
DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

(Dos mil treinta y siete pesos 42/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizadas en la obra.

**Concepto 511561.-** Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal.2. Se observan 20.00 mts. que importan la cantidad de \$ 5,421.84 (Cinco mil cuatrocientos veintiún pesos 84/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizado en la obra.

**Concepto 511564.-** Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal.1/0. Se observan 15.00 mts. que importan la cantidad de \$ 4,180.52 (Cuatro mil ciento ochenta pesos 52/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizado en la obra.

**Concepto 511567.-** Suministro e instalación de grapas para cincho de acero inoxidable. Se observan 3 pzas. que importan la cantidad de \$ 182.70 (Ciento ochenta y dos pesos 70/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizadas en la obra.

**Concepto 511591.-** Suministro y colocación de cable cal. 2 para neutro, marca condulac. Se observan 158 mts. que importan la cantidad de \$ 19,310.38 (Diez y nueve mil trescientos diez pesos 38/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizado en la obra.

**Concepto 511594.-** Suministro y colocación de cable cal. 1/0, marca condulac. Se observan 48 mts. que importan la cantidad de \$ 8,461.13 (Ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 13/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizado en la obra.

**Concepto 511597.-** Suministro y colocación de soldaduras cad weld. Se observan 4 piezas que importan la cantidad de \$ 508.08 (Quinientos ocho pesos 08/100 M.N.) que incluye el 16% de IVA, no localizadas en la obra.

Las diferencias mencionadas y los importes son derivados de multiplicar dichas diferencias por los precios unitarios correspondientes, se detallan en el formato de observación pecuniaria anexo a este documento.

Observándose un monto total de \$ 47,948.44 (Cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.) IVA incluido, mediante el folio N° 025/2011 (Se anexa). Infringiéndose lo establecido en el artículo 188 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y artículos 53 y 54 fracciones II y III del Reglamento de esta misma Ley.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010


RC-CON-001

www.jalisco.gob.mx

Juan  
09 Junio 2011  
1155am  
CON ANEXO  
Original y copia





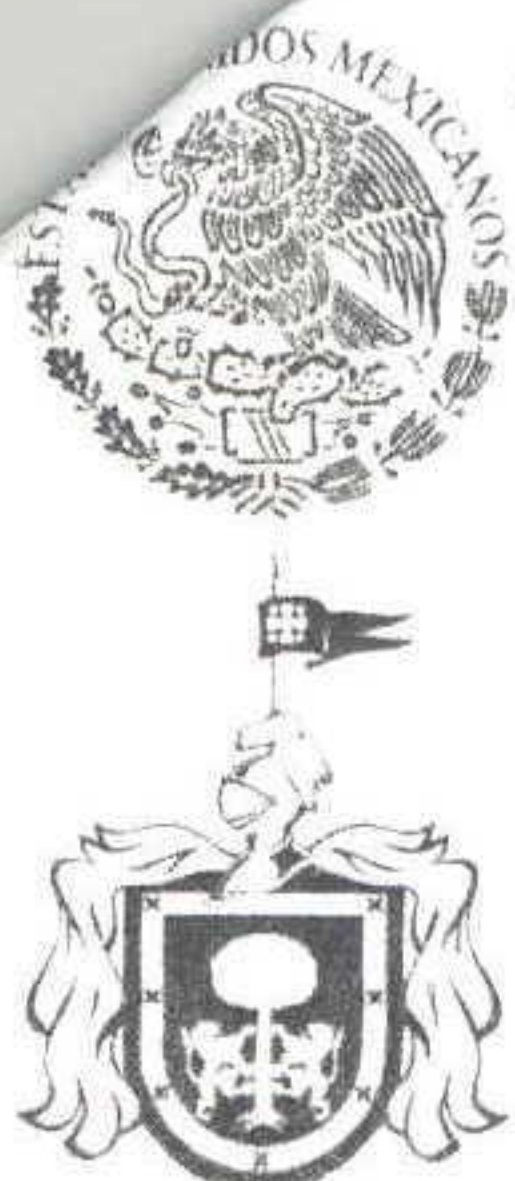

GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO

002970

OFICIO: 173/DGVCO-DOD-RT/2011 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Por lo antes expuesto, le solicito las aclaraciones al respecto y notifique a esta Dependencia en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de recibido el presente, sobre las acciones procedentes. Aperciéndole que en caso de ser omiso ante esta solicitud, estaría incurriendo en una violación a lo establecido en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración

Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca Director General de Verificación y Control de Obra

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural Mtra. María del Carmen Mendoza Flores.- Contralor del Estado

FJAG/FJGS/rbga\*

"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001





GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO

OFICIO 27-DGVCO-DOD-RT/2011  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 9 de marzo de 2011

001407

Ing. Serafín Vera Hernández (058)  
Recursos Estatales  
Supervisor

Presente.

Asunto: Oficio de comisión.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se le comisiona para que inicie la verificación física y documental a las obras denominadas: Construcción del Puente Vehicular en el Volantín, en el municipio de Autlán de Navarro, con la orden de trabajo SDR-121/10; Construcción y Equipamiento de Centro de Servicio Ganadero 1ra. Etapa en el Municipio de Villa Purificación, bajo las órdenes de trabajo SDR-779/09 y SDR-780/09, correspondientes al ejercicio presupuestal 2010, los días 15, 16, 17 y 18 de marzo del año en curso.

Para tal efecto se le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, asignándose el vehículo Ford Ranger, placas JS-00-104.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca  
Director General de Verificación y Control de Obra.

c.e.p. Archivo  
FJAG/ROGS/rmmp\*  
Vehículo JS-00-104  
Salida 7:00 a.m.  
Regreso 21:00  
Recorridos internos 250 kms  
Hospedaje

Recursos Estatales

"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

RECIBIDO  
11 MAR 2011  
CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA

RECIBIDO  
11 MAR 2011  
CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA

recibi original  
15/marzo/11
